Ид.	Название задачи	Антирисковые мероприятия	Длительность	Начало	Окончание
0	**Внедрение СУП Microsoft Project**		**154,88 дней?**	**Вт 15.07.03**	**Пн 16.02.04**
1	**Инициализация**		**12 дней**	**Вт 15.07.03**	**Чт 31.07.03**
2	Сбор исходной информации		7 дней	Вт 15.07.03	Чт 24.07.03
3	Работа над техническим заданием		10 дней	Чт 17.07.03	Чт 31.07.03
4	Окончание сбора информации		0 дней	Пн 21.07.03	Пн 21.07.03
5	**Подготовка документации проекта**		**32 дней?**	**Вт 22.07.03**	**Ср 03.09.03**
6	**Составление технического задания**		**12 дней?**	**Вт 22.07.03**	**Чт 07.08.03**
7	**Определение требований к СУП**		**3 дней?**	**Вт 22.07.03**	**Чт 24.07.03**
8	**Общие требования**		**2 дней?**	**Вт 22.07.03**	**Ср 23.07.03**
9	Назначение системы		1 день?	Вт 22.07.03	Вт 22.07.03
10	Область применения		1 день?	Ср 23.07.03	Ср 23.07.03
11	Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы		1 день?	Чт 24.07.03	Чт 24.07.03
12	Критерии успеха		3 дней	Пт 25.07.03	Ср 30.07.03
13	Рамки проекта		1 день?	Ср 30.07.03	Чт 31.07.03
14	Определение участников и их ролей		2 дней	Чт 31.07.03	Пн 04.08.03
15	Написание задания		3 дней	Пн 04.08.03	Чт 07.08.03
16	Подписание технического задания		0 дней	Чт 07.08.03	Чт 07.08.03
17	Ознакомление участников проекта с техническим заданием		2 дней	Чт 07.08.03	Пн 11.08.03
18	**Оценка рисков -мозговой штурм**		**5 дней**	**Пн 11.08.03**	**Пн 18.08.03**
19	Разработка опросных листов-выяснение мнения участников проекта		2 дней	Пн 11.08.03	Ср 13.08.03
20	Разработка антирисковых мероприятий и включение их в план-проекта.		3 дней	Ср 13.08.03	Пн 18.08.03
21	**Написание устава проекта**		**11 дней**	**Ср 20.08.03**	**Ср 03.09.03**
22	Таблица управления рисками		2 дней	Ср 20.08.03	Пт 22.08.03
23	Критерии успеха по каждому этапу		2 дней	Пт 22.08.03	Вт 26.08.03
24	План обучения		2 дней	Вт 26.08.03	Чт 28.08.03
25	Разработка форм документов, используемых во время проекта		2 дней	Чт 28.08.03	Пт 29.08.03
26	Согласование и утверждение устава		3 дней	Пн 01.09.03	Ср 03.09.03
27	**Корректировка и утверждение календарного плана**		**2 дней?**	**Пн 18.08.03**	**Ср 20.08.03**
28	Внесение артирисковых мероприятий		1 день?	Пн 18.08.03	Вт 19.08.03
29	Оценка критического пути и резервов времени		1 день?	Вт 19.08.03	Ср 20.08.03
30	Подготовка приказа о начале проекта		2 дней	Вт 19.08.03	Чт 21.08.03
31	Издание приказа по компании о начале проекта		3 дней	Чт 21.08.03	Вт 26.08.03
32	Покупка обучающей литературы	Антирисковое	1 день?	Вт 26.08.03	Ср 27.08.03
33	Рассылка списков задач участникам проекта		2 дней	Ср 27.08.03	Пт 29.08.03
34	Собрание команды проекта	Антирисковое	0 дней	Пт 29.08.03	Пт 29.08.03
35	**Подготовка к совещанию по постановке**		**9 дней?**	**Пт 29.08.03**	**Чт 11.09.03**
36	Составление перечня вопросов		1 день?	Пт 29.08.03	Пн 01.09.03
37	Ознакомление участвующих с повесткой, вопросами и регламентом		1 день?	Ср 10.09.03	Чт 11.09.03
38	Совещание с постановской задачи		1 день	Чт 11.09.03	Пт 12.09.03
39	Выделение ПК под сервер проектов		0 дней	Вт 15.07.03	Вт 15.07.03
40	Встреча сотрудников компании "Ближайшие перспективы развития"	Антирисковое	1 день	Пт 15.08.03	Пт 15.08.03
41	**Установка ПО**		**9 дней?**	**Ср 03.09.03**	**Вт 16.09.03**
42	На сервере		2 дней	Ср 03.09.03	Пт 05.09.03
43	Камеральное производство		1 день?	Пт 12.09.03	Пн 15.09.03
44	Директор		1 день?	Пн 15.09.03	Вт 16.09.03
45	Заместители директора		1 день?	Пн 15.09.03	Вт 16.09.03
46	**Создание макета решения с использованием технологии виртуальных машин**		**21 дней?**	**Чт 14.08.03**	**Пт 12.09.03**
47	Установка Windows Server и VMWare		3 дней	Чт 14.08.03	Вт 19.08.03
48	Подключение к SQL-Server		1 день?	Вт 19.08.03	Ср 20.08.03
49	Установка MS Project Server		3 дней	Ср 20.08.03	Пн 25.08.03
50	Объединение виртуальных машин в сеть и настройка почты		5 дней	Пн 25.08.03	Пн 01.09.03
51	Настройка сервера		3 дней	Пн 01.09.03	Чт 04.09.03
52	Организация работы в сети		3 дней	Чт 04.09.03	Вт 09.09.03
53	Тестирование работы Outlook Express	Антирисковое	3 дней	Вт 09.09.03	Пт 12.09.03
54	Встреча участников проекта	Антирисковое	1 день?	Пт 12.09.03	Пн 15.09.03
55	**Подготовка к обучению**		**55,4 дней**	**Вт 12.08.03**	**Пт 31.10.03**
56	**Подготовка пособий**		**45,4 дней**	**Пт 29.08.03**	**Пт 31.10.03**
57	Корректировка пособий		41,65 дней	Пт 29.08.03	Пн 27.10.03
58	Распечатка и брошюровка пособий		44,4 дней	Пн 01.09.03	Пт 31.10.03
59	**Подготовка классов**		**23 дней**	**Вт 12.08.03**	**Чт 11.09.03**
60	Решение вопроса с выделением класса		5 дней	Вт 12.08.03	Вт 19.08.03
61	Техническая подготовка классов		3 дней	Вт 09.09.03	Чт 11.09.03
62	**Написание конспектов**		**7 дней**	**Пт 12.09.03**	**Пн 22.09.03**
63	Эффективное управление проектами		2 дней	Пт 12.09.03	Вт 16.09.03
64	Календарное планирование		2 дней	Вт 16.09.03	Чт 18.09.03
65	Управление коммуникациями с применением MS Project Server		3 дней	Чт 18.09.03	Пн 22.09.03
66	**Обучение**		**54,65 дней?**	**Ср 10.09.03**	**Вт 25.11.03**
67	Настройка класса		2 дней	Пт 07.11.03	Вт 11.11.03
68	Начало обучения		0 дней	Пн 06.10.03	Пн 06.10.03
69	**1 цикл**		**42,65 дней?**	**Ср 10.09.03**	**Пт 07.11.03**
70	1 группа.Эффективное управление проектами и календарное планирование		2 дней?	Ср 10.09.03	Чт 11.09.03
71	1 группа. Управление проектами с использованием MS Project		3 дней?	Пт 12.09.03	Вт 16.09.03
72	2 группа.Эффективное управление проектами и календарное планирование		0,88 дней	Пт 26.09.03	Пт 26.09.03
73	2 группа. Управление проектами с использованием MS Project		4,5 дней?	Сб 27.09.03	Пт 03.10.03
74	Зачет№1 1 группа		6,35 дней?	Ср 17.09.03	Пт 07.11.03
75	3 группа.Эффективное управление проектами и календарное планирование		0,88 дней?	Ср 01.10.03	Ср 01.10.03
76	3 группа. Управление проектами с использованием MS Project		1,88 дней?	Чт 02.10.03	Пт 03.10.03
77	Зачет№1 3-я группа		1 день?	Пт 10.10.03	Пт 10.10.03
78	**2 цикл**		**21,65 дней?**	**Вт 14.10.03**	**Ср 12.11.03**
79	1 группа.Расширенный курс MS Project		5 дней	Вт 14.10.03	Пн 20.10.03
80	Консультация 1 группа		1 день?	Пн 20.10.03	Вт 21.10.03
81	Зачет№2 1 группа		3 дней	Ср 22.10.03	Пн 27.10.03
82	2 группа.Управление персоналом. Управление рисками		1 день?	Пн 10.11.03	Вт 11.11.03
83	2 группа.Расширенный курс MS Project		1 день?	Вт 11.11.03	Ср 12.11.03
84	**Организация входа на Projectserver из интернет**		**3 дней?**	**Пт 07.11.03**	**Ср 12.11.03**
85	Составление СДРабот		1 день?	Пт 07.11.03	Пн 10.11.03
86	Разработка календарного плана		1 день?	Пн 10.11.03	Вт 11.11.03
87	Расчет бюджета		1 день?	Вт 11.11.03	Ср 12.11.03
88	**2 недели**		**3 дней?**	**Чт 13.11.03**	**Вт 18.11.03**
89	1группа. Управление коммуникациями с применением MS Project Server		1 день?	Чт 13.11.03	Пт 14.11.03
90	2 группа.Управление коммуникациями с применением MS Project Server		1 день?	Пт 14.11.03	Пн 17.11.03
91	2 группа. Управление проектами с использованием Microsoft Project Server		1 день?	Пн 17.11.03	Вт 18.11.03
92	Дополнительное время для обучения	Антирисковое	5 дней	Вт 18.11.03	Вт 25.11.03
93	**Разработка пилотного проекта**		**26 дней?**	**Ср 17.09.03**	**Ср 22.10.03**
94	Подготовка информации для заказчика		1 день	Ср 17.09.03	Ср 17.09.03
95	Выкладывание информации от менеджера пПроекта на сайте		1 день	Чт 18.09.03	Чт 18.09.03
96	Сбор информации по предыдущим проектам		8 дней	Ср 17.09.03	Пт 26.09.03
97	Создание шаблона календарного плана типового проекта		10 дней	Пн 29.09.03	Пт 10.10.03
98	Описание типовых рисков		8 дней	Пн 13.10.03	Ср 22.10.03
99	Публикование Календарного плана пилотного проекта на сервере		1 день?	Чт 18.09.03	Чт 18.09.03
100	Запуск пилотного проекта в подразделениях		0 дней	Пн 01.09.03	Пн 01.09.03
101	**Самара(пилотный проект)**		**122,55 дней**	**Чт 28.08.03**	**Пн 16.02.04**

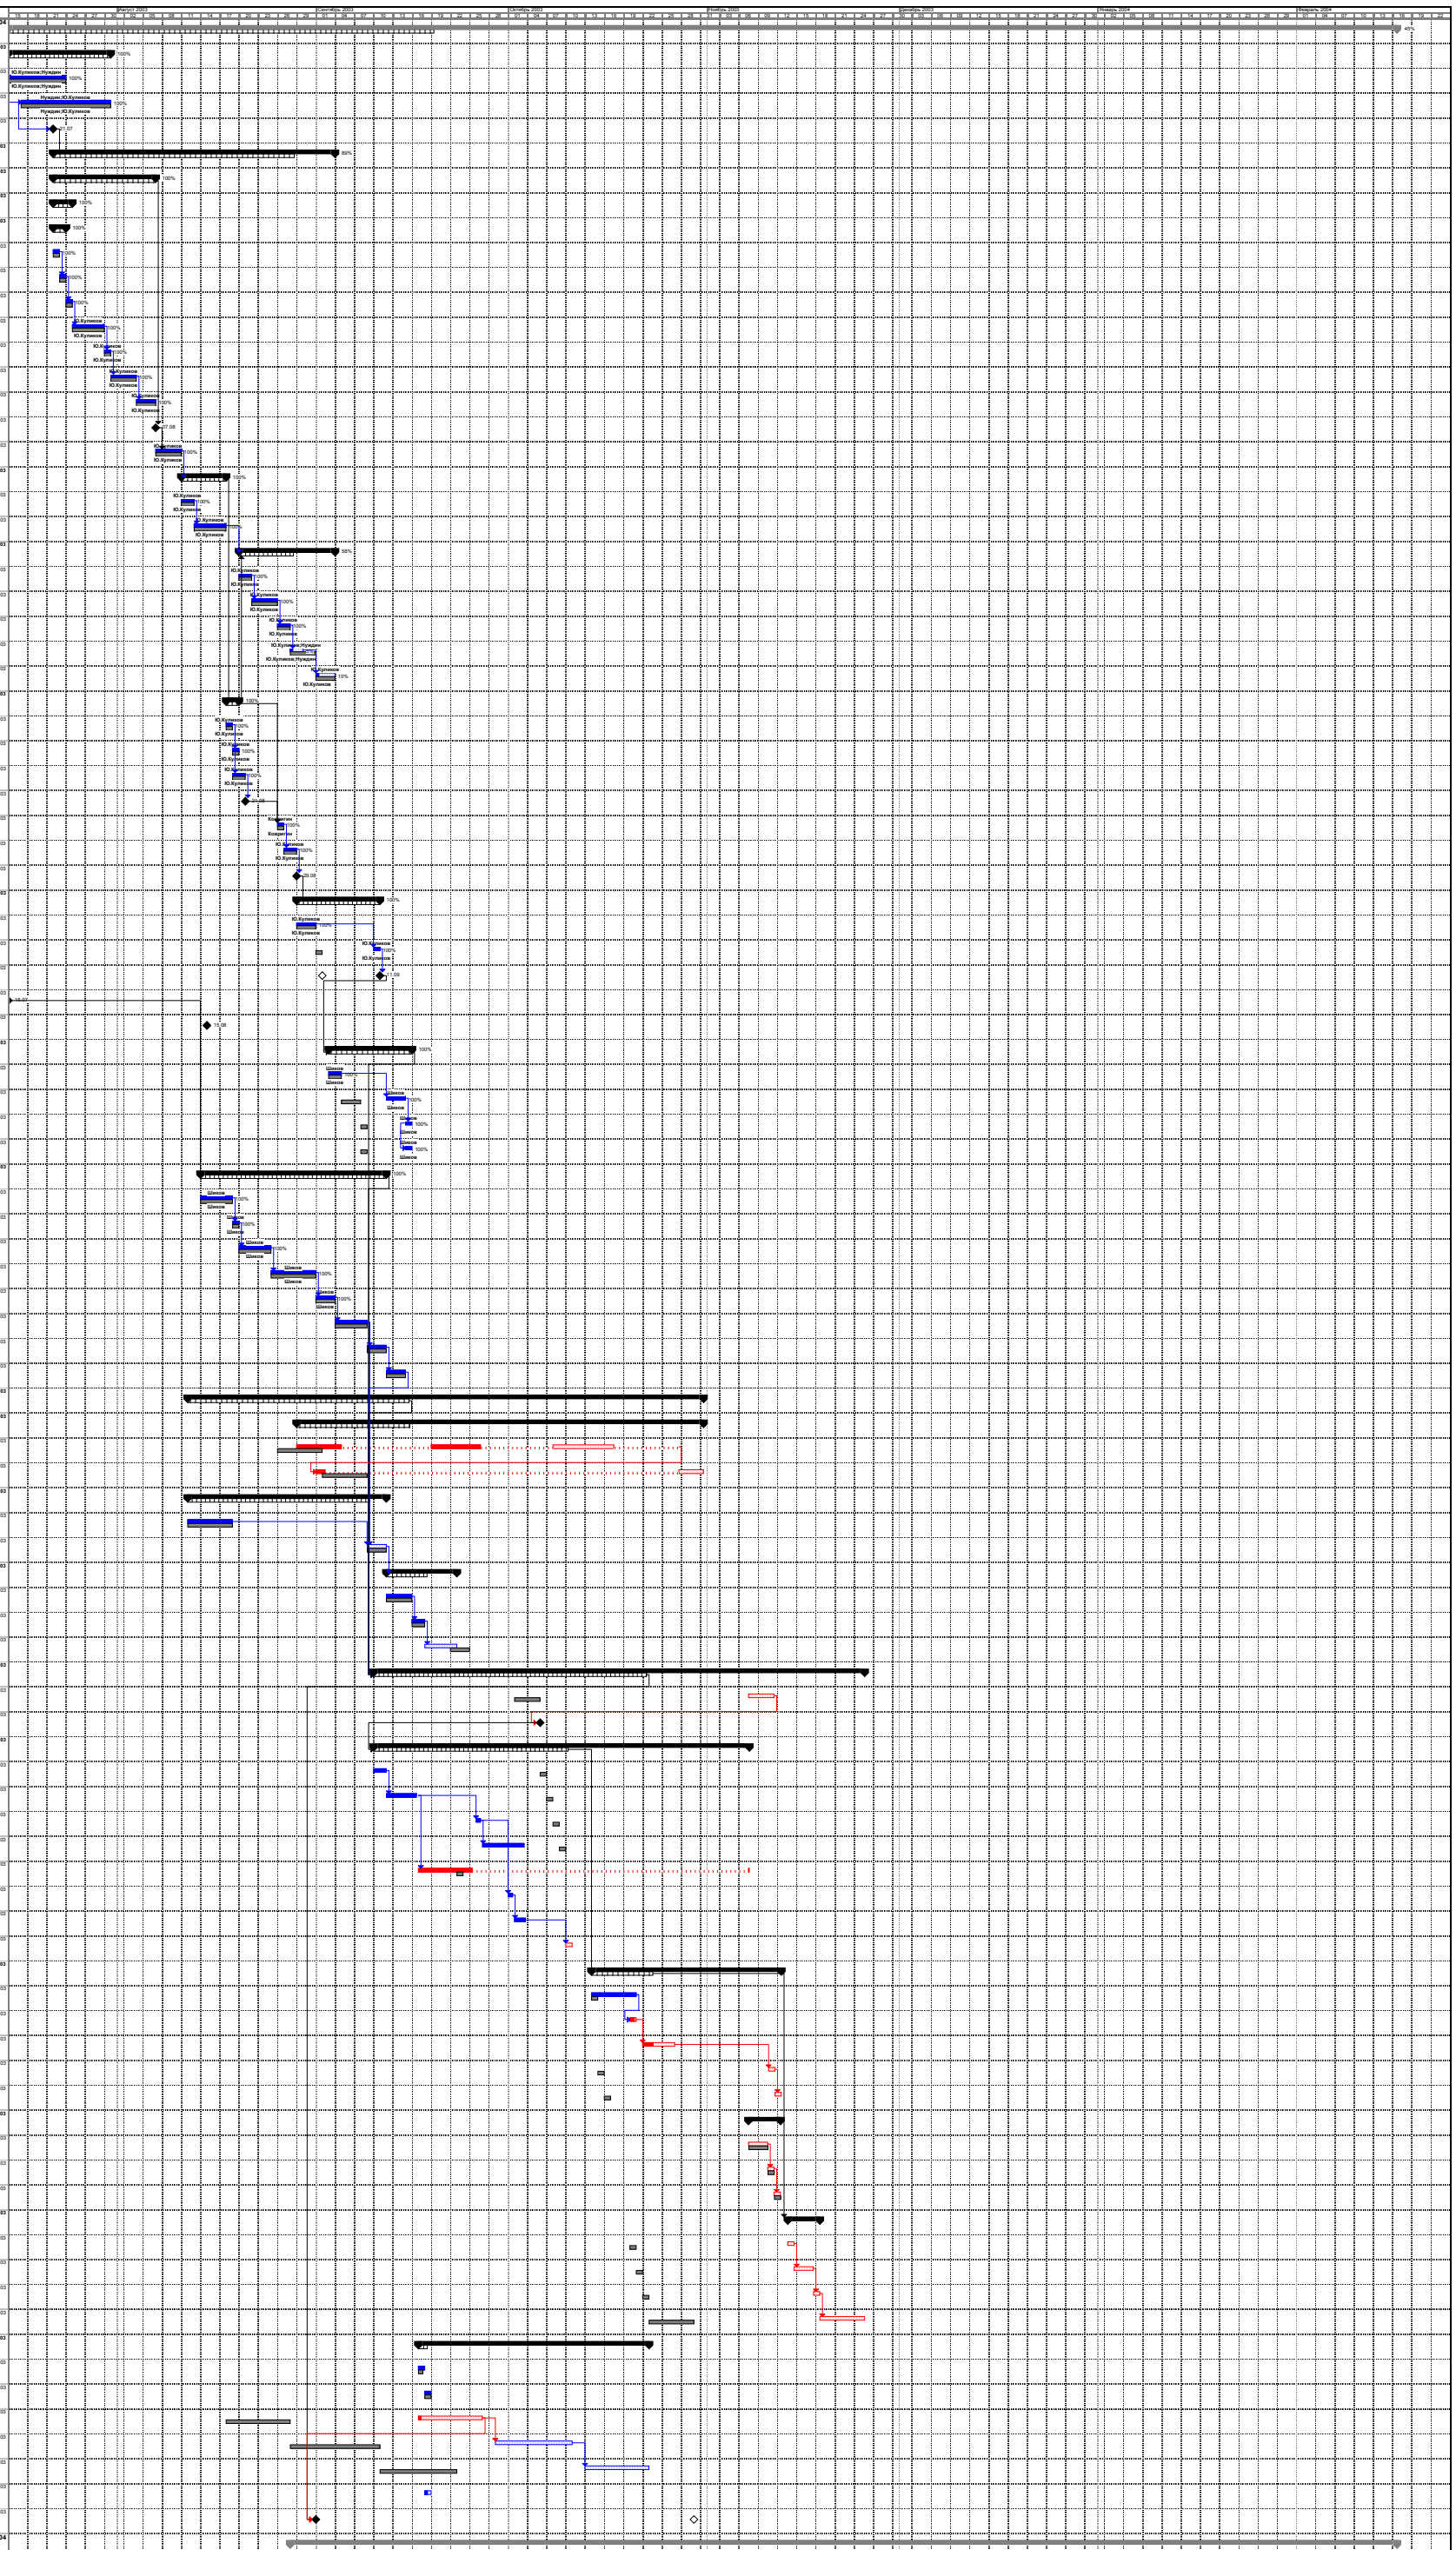

Проект: Внедрение СУП Microsoft Pr
Дата: Вт 25.10.05

Критическая задача | Критическое прерывание | Задача | Критический ход выполнения | Прерывание на | Базовая задача | Базовое прерывание | Базовая веха | Веха | Суммарный ход выполнения | Суммарная задача | Суммарная задача проекта | Внешние задачи | Внешняя веха | Крайний срок
